

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà - DPD018

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST - BACINO LIRI GARIGLIANO
AVEZZANO (AQ)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Reg. (UE) 1305/2013

Misura: 04 - Sottomisura: 4.3- Intervento 4.3.1

Completamento funzionale dello schema irriguo esistente,
comprensorio Avezzano-Celano, con nuove infrastrutture irrigue e
con investimenti in dispositivi elettronici.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TAVOLA

M

Scala:

Data: 14/11/ 2018

Progettista :

Dott. Ing. Mauro Contestabile

Collaboratori :

Settore Catasto:
Sig.ra Eleonora Viglione
Dott. Alessandro Raschiatore

Settore Tecnico:
Perito Elettronico Francesco Colizza
Geom. Francesco Marcellitti

R.U.P. :

Geom. Filippo Zaurrini

Collaboratori :

Settore Amministrativo:
Dott. Abramo Bonaldi
Rag. Roberto D'Amico

Settore Tecnico:
Geom. Francesco Marcellitti

Approvazioni

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
INSTALLAZIONE CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA				
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	2	01/10/2020	02/10/2020
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	2	05/10/2020	06/10/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	2	07/10/2020	08/10/2020
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	08/10/2020	08/10/2020
REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIAMETRO 800 mm				
Scavo a sezione obbligata	56	82	09/10/2020	29/12/2020
Posa di condotta idrica del dn 800	55	79	12/10/2020	29/12/2020
Rinterro di scavo	52	76	15/10/2020	29/12/2020
REALIZZAZIONE DI CONDOTTA RIPARTITRICE DEL DIAMETRO 700 mm				
Scavo a sezione obbligata	61	87	30/12/2020	26/03/2021
Posa di condotta idrica del dn 700 e/o 800	60	86	31/12/2020	26/03/2021
Rinterro di scavo	60	86	31/12/2020	26/03/2021
REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 8				
Scavo a sezione obbligata	65	92	29/03/2021	28/06/2021
Posa di condotta idrica compreso i pezzi speciali	65	92	29/03/2021	28/06/2021
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. "POZZETTI"	43	59	29/06/2021	26/08/2021
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	43	59	29/06/2021	26/08/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per pozzetti in c.a.	43	59	29/06/2021	26/08/2021
Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini attraversamenti stradali)	5	7	27/08/2021	02/09/2021
REALIZZAZIONE DI RETE IDRAULICA DI STRADA 14				
Scavo a sezione obbligata	60	85	03/09/2021	26/11/2021
Posa di condotta idrica compreso i pezzi speciali	60	85	03/09/2021	26/11/2021
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. "POZZETTI"	38	54	15/11/2021	07/01/2022
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	38	54	15/11/2021	07/01/2022
Lavorazione e posa ferri di armatura per pozzetti in c.a.	38	54	15/11/2021	07/01/2022
Formazione di manto di usura e collegamento (ripristini attraversamenti stradali)	6	8	07/01/2022	14/01/2022
REALIZZAZIONE DI PREMENTE-COLLEGAMENTO DEL POZZO DI STRADA 12 E 13 ALLA RIPARTITRICE				
Scavo a sezione obbligata	20	29	21/12/2021	18/01/2022
Posa di condotta idrica del dn 250	20	29	21/12/2021	18/01/2022
Rinterro di scavo	20	29	21/12/2021	18/01/2022
RISANAMENTO CONSERVATIVO POZZO DI STRADA 12 E 13 COMPRESO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ELETTROPOMPE SOMMERSE E NUOVI QUADRI ELETTRICI				
Rimozione di elettropompe sommerse	4	5	03/01/2022	07/01/2022
Perforazioni con sonda per pulizia pozzo	16	22	07/01/2022	28/01/2022
Fornitura e posa in opera di elettropompe sommerse	10	12	24/01/2022	04/02/2022
Rimozione di apparecchiature elettriche	2	2	03/02/2022	04/02/2022
Fornitura e posa in opera di filtro ante gradiente di tensione tipo FLT 315/A	1	1	07/02/2022	07/02/2022
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico	4	4	07/02/2022	10/02/2022

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Reg. (UE) 1305/2013


Misura: 04-Sottomisura: 4.3-Intervento 4.3.1

Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano-Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi

elettronici. - Pag. 3

Tabella Analitica Gantt

REALIZZAZIONE DI TELECONTROLLO					
Realizzazione di telecontrollo	28	38	26/01/2022	04/03/2022	
SMOBILIZZO CANTIERE					
Smobilizzo del cantiere	5	5	07/03/2022	11/03/2022	
<p>LEGENDA:</p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>					

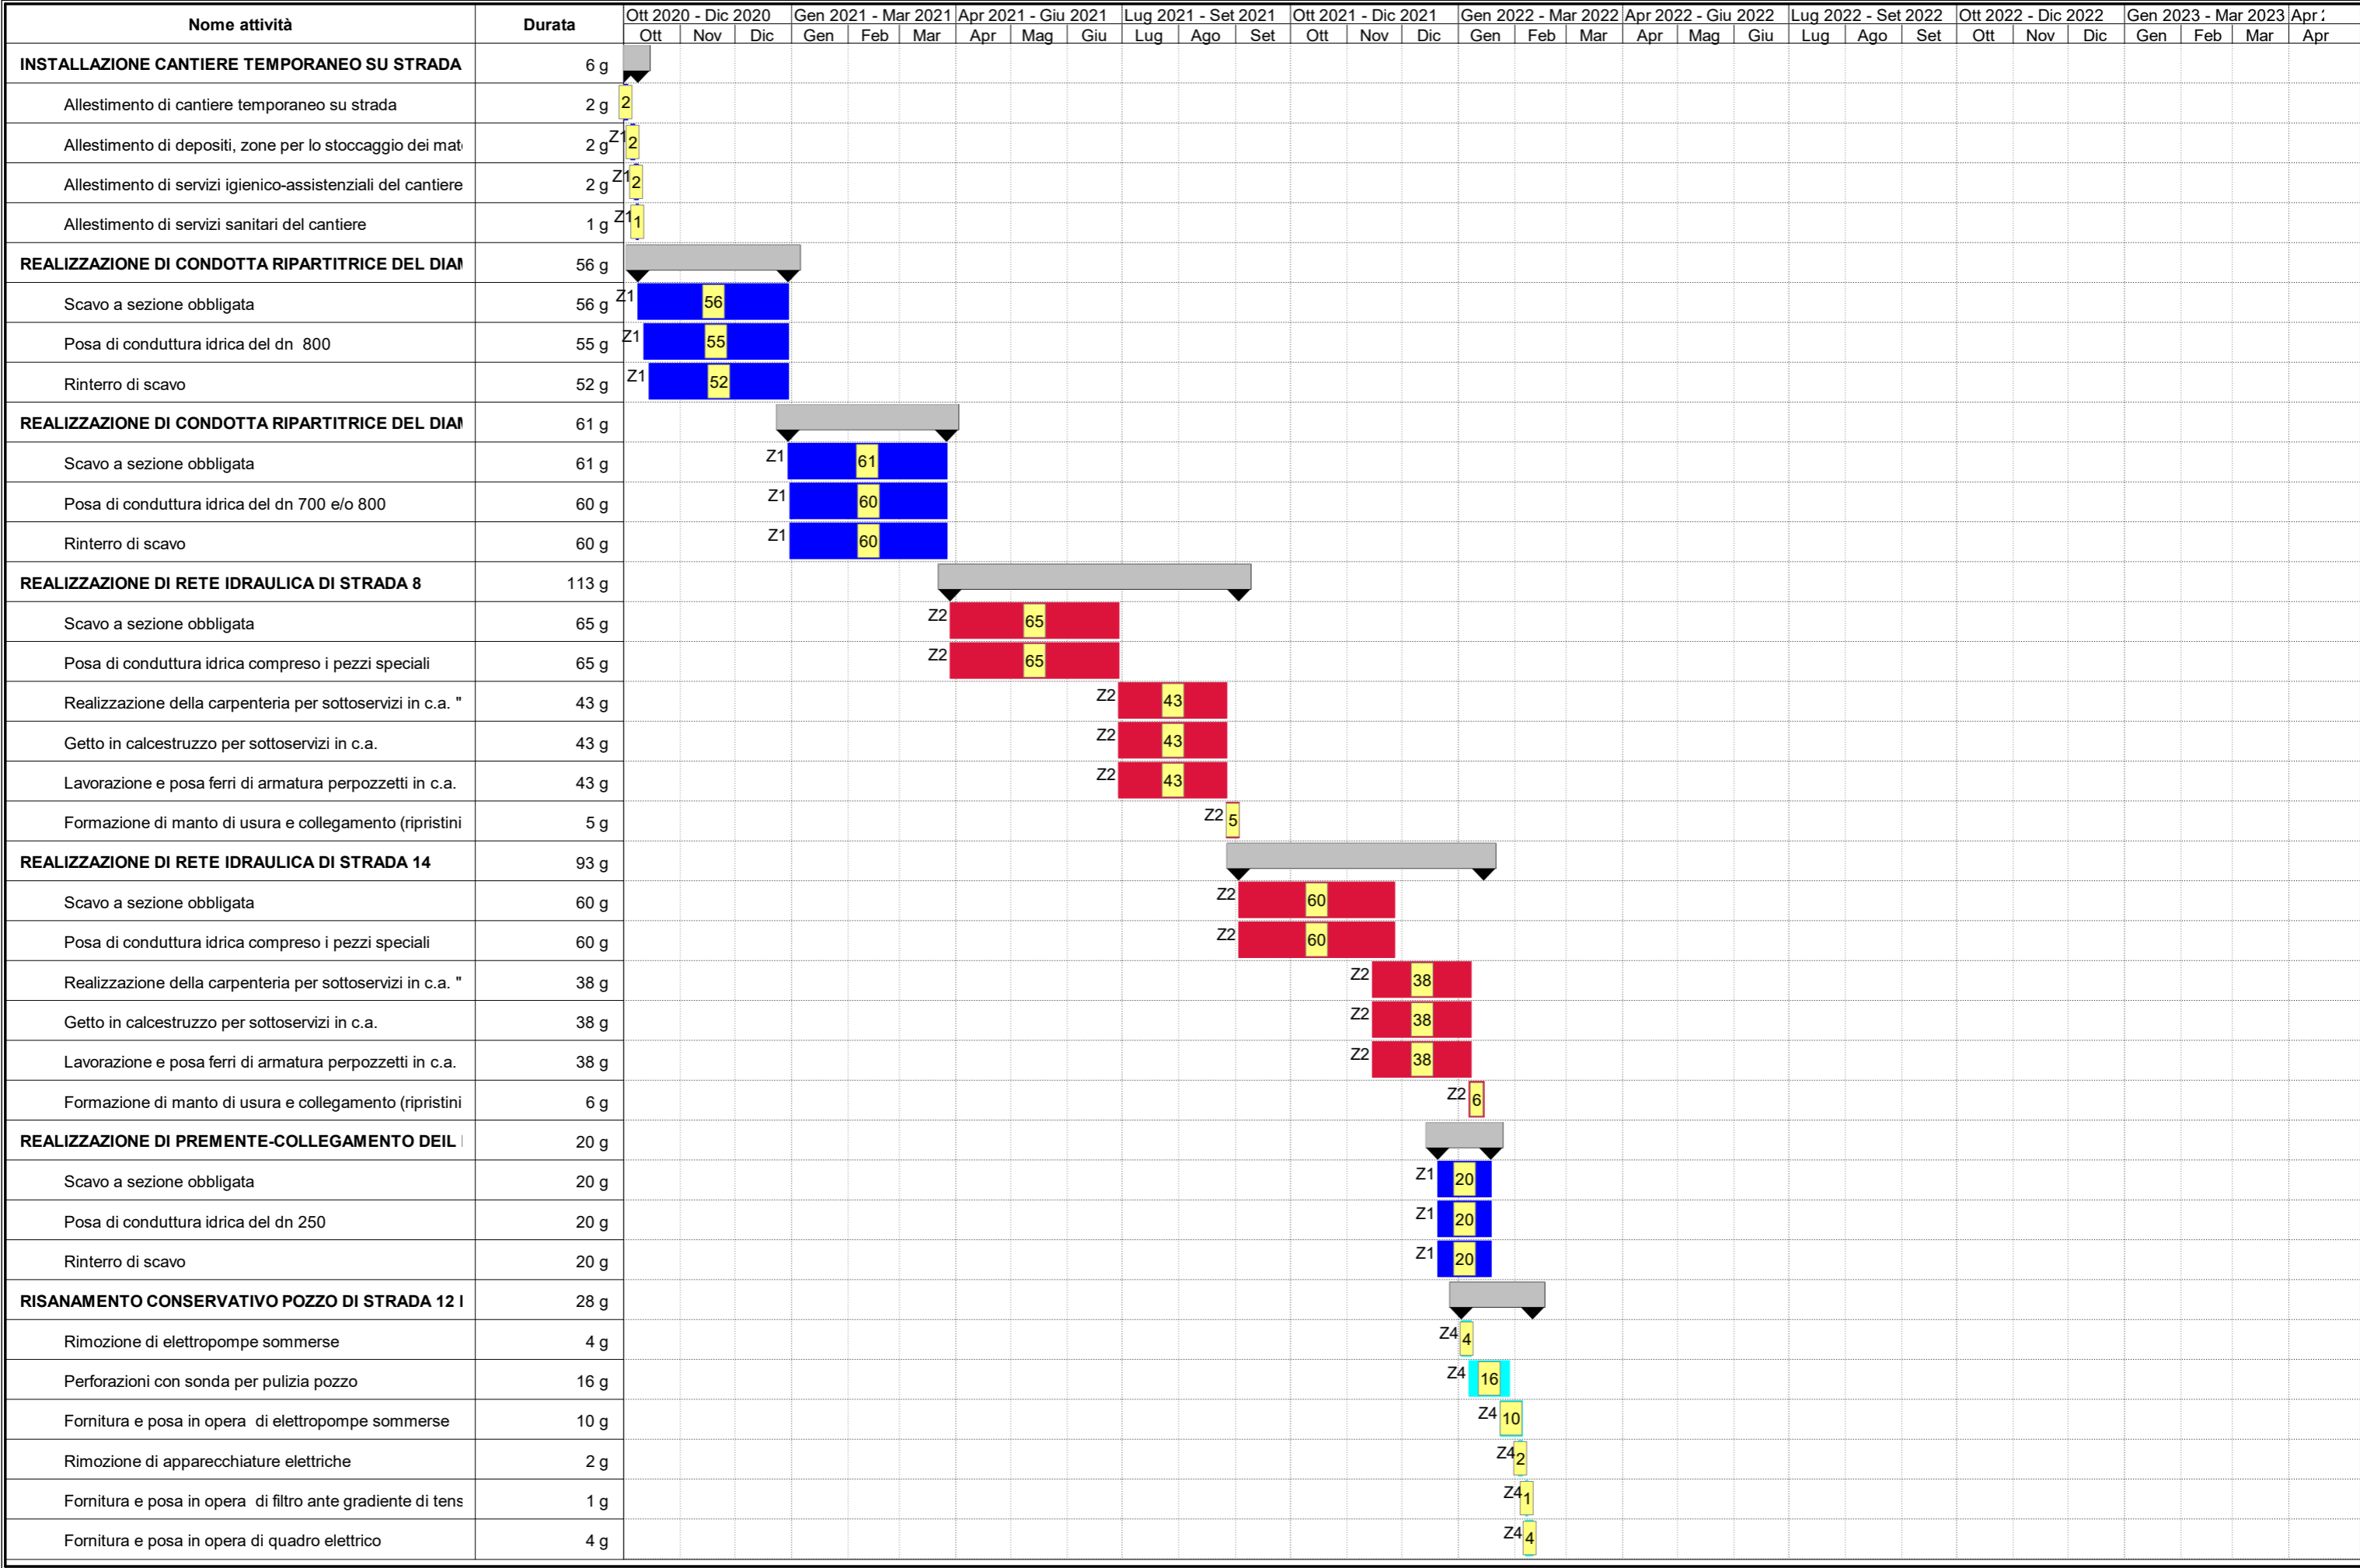

[illegible]
